




MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2019  
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTO COMUNITARIOS	EJ. CACAO	2.00 EQUIPOS	\$ 885,950.00	\$ 874,500.00	01/03/2019	28/06/2019	RAMO 33 FIII	80 PRODUCTORES	CONCLUIDO
2	IO001.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	VILLA CHABLE	1.00 COMEDOR	\$ 535,239.30	\$ 530,066.78	08/04/2019	06/06/2019	RAMO 33 FIII	3,377 HABITANTES	CONCLUIDO
3	IO005.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	EJ. NUEVO POCHOTE	1.00 COMEDOR	\$ 535,239.30	\$ 526,823.45	08/04/2019	06/06/2019	RAMO 33 FIII	230 HABITANTES	CONCLUIDO
4	C0302.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	10.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 427,666.28	\$ 422,009.95	08/04/2019	07/05/2019	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
5	C0303.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. LA ISLA	10.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 425,666.06	\$ 420,622.03	08/04/2019	07/05/2019	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
6	C0304.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	POB. CHACAMA	10.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 302,531.13	\$ 295,111.00	13/05/2019	11/06/2019	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
7	C0305.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. CACAO	5.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 218,673.17	\$ 202,844.47	08/04/2019	02/05/2019	RAMO 33 FIII	5 FAMILIAS	CONCLUIDO
8	C0306.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. CHACAJ	5.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 216,575.82	\$ 204,511.38	08/04/2019	02/05/2019	RAMO 33 FIII	5 FAMILIAS	CONCLUIDO
9	C0307.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. MARICHE	1.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 48,149.19	\$ 46,828.26	08/04/2019	22/04/2019	RAMO 33 FIII	1 FAMILIA	CONCLUIDO
10	C0308.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. ABASOLO	2.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 90,429.68	\$ 85,808.01	08/04/2019	22/04/2019	RAMO 33 FIII	2 FAMILIAS	CONCLUIDO
11	C0309.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. MARICHE	1.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 48,148.39	\$ 46,949.68	08/04/2019	22/04/2019	RAMO 33 FIII	1 FAMILIA	CONCLUIDO
12	C0310.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	POB. GREGORIO MENDEZ	15.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 508,013.14	\$ 498,257.03	13/05/2019	03/07/2019	RAMO 33 FIII	15 FAMILIAS	CONCLUIDO
13	C0311.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VILLA CHABLE	15.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 446,711.17	\$ 422,584.02	13/05/2019	03/07/2019	RAMO 33 FIII	15 FAMILIAS	CONCLUIDO
14	C0314.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. CONCEPCION	15.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 643,729.60	\$ 626,261.80	13/05/2019	03/07/2019	RAMO 33 FIII	15 FAMILIAS	CONCLUIDO
15	IO003.- MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 COMEDOR	\$ 170,607.99	\$ 161,921.01	13/05/2019	11/06/2019	RAMO 33 FIII	530 HABITANTES	CONCLUIDO
16	IO022.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 SISTEMA	\$ 1,099,162.55	\$ 1,053,774.04	13/05/2019	30/07/2019	RAMO 33 FIII	113 FAMILIAS	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO KARIAS  
COORDINADOR DEL RAMO 33

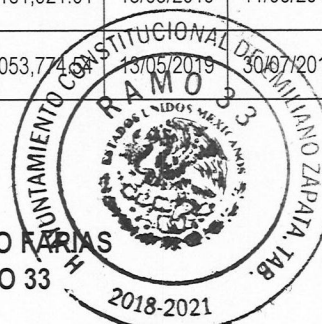



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2019  
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
17	I0029.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE F'C=150 KG/CM2 EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	930.88 M.L.	\$ 375,979.32	\$ 365,113.32	20/05/2019	27/06/2019	RAMO 33 FIII	1,924 HABITANTES	CONCLUIDO
18	I0030.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	3,332.38 M2	\$ 2,475,113.49	\$ 2,430,500.88	03/06/2019	31/07/2019	RAMO 33 FIII	1,924 HABITANTES	CONCLUIDO
19	I0032.- CONSTRUCCION DE BANQUETA CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	869.16 M2	\$ 301,245.57	\$ 295,798.24	20/05/2019	27/06/2019	RAMO 33 FIII	1,924 HABITANTES	CONCLUIDO
20	I0007.- AMPLACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. BUENOS AIRES	CD. E. ZAPATA (COL. BUENOS AIRES)	15.00 POSTES	\$ 1,328,842.26	\$ 1,302,197.49	15/07/2019	12/09/2019	RAMO 33 FIII	30 FAMILIAS	CONCLUIDO
21	I0008.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE ARMIN MARIN)	16.00 POSTES	\$ 1,660,677.25	\$ 1,628,735.33	15/07/2019	12/09/2019	RAMO 33 FIII	31 FAMILIAS	CONCLUIDO
22	I0031.- AMPLACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. LA PITA	EJIDO LA PITA	14.00 POSTES	\$ 852,307.54	\$ 812,352.00	15/07/2019	12/09/2019	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARRAS  
COORDINADOR DEL RAMO 33







MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
 PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2019  
 INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
 Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
23	I0037.- BSB09 REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO EN LA CD. EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	1.00 CARCAMO	\$ 2,215,118.00	\$ 869,828.22	22/08/2019	30/09/2019	RAMO 33 FIII	1,165 MUJERES 928 HOMBRES	CONCLUIDO
24	I0038.- BSB10 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SANTA FE DE LA CD. EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. SANTA FE)	545.46 M.L.	\$ 7,530,322.00	\$ 2,972,908.64	12/08/2019	24/11/2019	RAMO 33 FIII	1,165 MUJERES 928 HOMBRES	CONCLUIDO
25	I0039.- BSB08 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	189.75 M.L.	\$ 1,501,120.00	\$ 590,101.42	22/08/2019	22/10/2019	RAMO 33 FIII	1,154 MUJERES 770 HOMBRES	CONCLUIDO
26	I0042.- MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RA. AGUACATE	RA. AGUACATE	1.00 REHABILITACION	\$ 170,304.44	\$ 168,554.91	02/09/2019	05/10/2019	RAMO 33 FIII	206 HABITANTES	CONCLUIDO
27	I0043.- MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RANCHERÍA LA ISLA	RA. LA ISLA	1.00 REHABILITACION	\$ 170,627.78	\$ 169,256.85	02/09/2019	11/10/2019	RAMO 33 FIII	505 HABITANTES	CONCLUIDO
28	I0045.- MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA POB. GREGORIO MENDEZ	POB. GREGORIO MENDEZ	1.00 REHABILITACION	\$ 197,177.52	\$ 195,896.57	02/09/2019	05/10/2019	RAMO 33 FIII	1,307 HABITANTES	CONCLUIDO
29	I0047.- MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RA. POCVICUC	RA. POCVICUC	1.00 REHABILITACION	\$ 168,704.73	\$ 166,981.85	02/09/2019	11/10/2019	RAMO 33 FIII	113 HABITANTES	CONCLUIDO
30	I0049.- MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA EJ. RIO FINAL	EJIDO RIO FINAL	1.00 REHABILITACION	\$ 171,438.27	\$ 169,523.36	02/09/2019	05/10/2019	RAMO 33 FIII	231 HABITANTES	CONCLUIDO
31	I0051.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	VILLA CHABLE	10.00 VIVIENDAS	\$ 2,042,891.81	\$ 2,002,445.74	02/09/2019	30/11/2019	RAMO 33 FIII	10.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
32	I0052.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	POB. CHACAMA	10.00 VIVIENDAS	\$ 2,042,891.81	\$ 2,007,987.38	02/09/2019	30/11/2019	RAMO 33 FIII	10.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
33	I0053.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	POB. GREGORIO MENDEZ	10.00 VIVIENDAS	\$ 2,024,263.06	\$ 1,987,376.07	02/09/2019	30/11/2019	RAMO 33 FIII	10.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
34	I0054.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	CD. E. ZAPATA (COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	5.00 VIVIENDAS	\$ 1,013,244.79	\$ 995,520.56	03/09/2019	30/11/2019	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
35	I0055.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	5.00 VIVIENDAS	\$ 1,013,244.79	\$ 995,520.56	04/09/2019	30/11/2019	RAMO 33 FIII	5.00 VIVIENDAS	CONCLUIDO
36	I0056.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	5.00 VIVIENDAS	\$ 1,013,244.79	\$ 995,520.56	06/09/2019	30/11/2019	RAMO 33 FIII	5.00 VIVIENDAS	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO BARRAS  
 COORDINADOR DEL RAMO 33





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2019  
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
Juntas creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
37	I0057.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	CD. E. ZAPATA (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	4.00 VIVIENDAS	\$ 810,595.89	\$ 796,416.49	06/09/2019	30/11/2019	RAMO 33 FIII	4.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
38	I0058.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	CD. E. ZAPATA (COL. SANTA FE)	1.00 VIVIENDA	\$ 202,648.90	\$ 197,960.46	02/09/2019	30/09/2019	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
39	C0382.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. POCVICUC	218.51 M2	\$ 89,311.31	\$ 85,478.05	16/09/2019	10/10/2019	RAMO 33 FIII	7.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
40	C0383.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO LA PITA	210.80 M2	\$ 103,511.87	\$ 101,533.24	16/09/2019	10/10/2019	RAMO 33 FIII	6.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
41	C0384.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO RIO FINAL	236.67 M2	\$ 101,656.14	\$ 99,467.89	16/09/2019	10/10/2019	RAMO 33 FIII	7.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
42	C0385.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. COROZAL	330.70 M2	\$ 157,183.97	\$ 154,187.20	16/09/2019	15/10/2019	RAMO 33 FIII	9.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
43	C0386.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO NUEVO CHABLE	151.04 M2	\$ 75,334.25	\$ 73,439.61	16/09/2019	10/10/2019	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
44	C0387.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJ. E. ZAPATA, SECC. JOBAL	170.68 M2	\$ 66,992.78	\$ 65,700.36	16/09/2019	10/10/2019	RAMO 33 FIII	6.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
45	C0388.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	452.84 M2	\$ 258,842.42	\$ 254,220.99	16/09/2019	15/10/2019	RAMO 33 FIII	11.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
46	C0389.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJ. REFORMA	168.70 M2	\$ 96,707.52	\$ 94,501.36	16/09/2019	10/10/2019	RAMO 33 FIII	4.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
47	C0390.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PIEDRAL	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	97.00 LUMINARIAS	\$ 497,563.44	\$ 497,563.44	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	481.00 HABITANTES	CONCLUIDO
48	C0391.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	19.00 LUMINARIAS	\$ 97,460.88	\$ 97,460.88	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	90.00 HABITANTES	CONCLUIDO
49	C0392.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA FE	CD. E. ZAPATA (COL. SANTA FE)	20.00 LUMINARIAS	\$ 102,590.40	\$ 102,590.40	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	195.00 HABITANTES	CONCLUIDO
50	C0393.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JOSE LEHMAN	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN)	27.00 LUMINARIAS	\$ 138,497.04	\$ 138,497.04	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	88.00 HABITANTES	CONCLUIDO
51	C0394.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JOSE ARMIN	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE ARMIN)	4.00 LUMINARIAS	\$ 20,518.08	\$ 20,518.08	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	79.00 HABITANTES	CONCLUIDO
52	C0395.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BUENOS AIRES	CD. E. ZAPATA (COL. BUENOS AIRES)	13.00 LUMINARIAS	\$ 66,683.76	\$ 66,683.76	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	115.00 HABITANTES	CONCLUIDO
53	C0396.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO	CD. E. ZAPATA (COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	53.00 LUMINARIAS	\$ 271,864.56	\$ 271,864.56	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	192.00 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS  
COORDINADOR DEL RAMO 33







MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2019  
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
54	C0397.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	CD. E. ZAPATA (COL. SANTA CRUZ)	15.00 LUMINARIAS	\$ 76,942.80	\$ 76,942.80	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	75.00 HABITANTES	CONCLUIDO
55	C0398.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO REFORMA	EJIDO REFORMA	18.00 LUMINARIAS	\$ 92,331.36	\$ 92,331.36	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	320.00 HABITANTES	CONCLUIDO
56	C0399.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO GREGORIO MENDEZ	POB. GREGORIO MENDEZ	190.00 LUMINARIAS	\$ 974,608.80	\$ 974,608.80	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	1,560.00 HABITANTES	CONCLUIDO
57	C0400.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. AGUACATE	RA. AGUACATE	24.00 LUMINARIAS	\$ 123,108.48	\$ 123,108.48	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	332.00 HABITANTES	CONCLUIDO
58	C0401.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA PITA	EJIDO LA PITA	3.00 LUMINARIAS	\$ 15,388.56	\$ 15,388.56	02/09/2019	30/10/2019	RAMO 33 FIII	255.00 HABITANTES	CONCLUIDO
59	I0062.- REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	377.46 M2	\$ 215,820.76	\$ 212,319.37	17/09/2019	30/09/2019	RAMO 33 FIII	530.00 HABITANTES	CONCLUIDO
60	A0063.- ADQUISICION PAQUETE DE ESTACION TOTAL (EQUIPO TOPOGRAFICO DE ALTA PRECISION) (GASTO INDIRECTO)	CD. E. ZAPATA	1.00 PAQUETE	\$ 138,441.94	\$ 138,441.94	01/08/2019	30/09/2019	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
61	A0064.- ADQUISICION DE DRON (GASTO INDIRECTO)	CD. E. ZAPATA	1.00 PIEZA	\$ 64,405.00	\$ 40,999.00	01/08/2019	30/09/2019	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
62	A0065.- KIT NAVEGADOR GPS (GASTO INDIRECTO)	CD. E. ZAPATA	2.00 EQUIPOS	\$ 24,278.80	\$ 24,278.80	01/08/2019	30/09/2019	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
63	A0066.- ADQUISICION DE PAQUETE DE NIVEL AUTOMATICO	CD. E. ZAPATA	1.00 PAQUETE	\$ 9,590.88	\$ 9,590.88	01/08/2019	30/09/2019	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
64	I0066.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS ISLADOS) EN EL EJIDO NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO POCHOTE	9.55 KM	\$ 416,921.17	\$ 416,921.17	14/12/2019	28/12/2019	RAMO 33 FIII	230 HABITANTES	CONCLUIDO

RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2019  
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.- GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	CAB. MPAL.	1.00 ACCION	\$ 16,069,517.89	\$ 18,031,273.79	01/01/2019	31/12/2019	RAMO 33 FIV	86 ELEMENTOS	CONCLUIDO
2	C0250.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	6.00 MANTENIMIENTO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,226,050.53	01/01/2019	31/12/2019	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
3	I0040.- REPOSICION DE 121.50 ML. CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE GARDENIA Y AV. CAMINO GANADERO	CD. E. ZAPATA	116.10 M.L.	\$ 266,064.83	\$ 262,100.39	15/08/2019	13/09/2019	RAMO 33 FIV	972.00 HABITANTES	CONCLUIDO
4	I0041.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE POCVICUC ENTRE CALLE USUMACINTA Y AV. LEONA VICARIO	CD. E. ZAPATA	1,051.68 M2	\$ 1,233,935.17	\$ 1,277,779.82	15/08/2019	13/10/2019	RAMO 33 FIV	1,864.00 HABITANTES	CONCLUIDO
5	C0430.- GASTOS DE OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CD. E. ZAPATA	1.00 SUMINISTRO	\$ 161,505.27	\$ 161,370.05	15/08/2019	31/12/2019	RAMO 33 FIV	3,377 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS  
COORDINADOR DEL RAMO 33

